

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

南武橋 架け替え事業 かわら版 Vol.11

2022.9 発行
兵庫県 西宮土木事務所
武庫川対策室

南武橋架け替え事業の状況と工事予定についてお知らせします

尼崎市側の「①元浜橋設置外工事〔(株)松田組〕」の工事箇所において、地中から杭や鋼矢板などの埋設物を確認しました(裏面：写真①、②)。
このため、約4ヶ月工事が遅延する見込みとなりました。

この間、尼崎市道 2414 号線の交通規制、工事用車両の通行、振動・騒音が継続することとなり、皆様にはご不便をお掛けすることとなります。
引き続き、通行の安全確保に努めますので工事へのご理解とご協力をお願いします。

また、南武橋新橋へ車両交通を切り替えるための工事「②③南武橋道路改良工事」についても、「①元浜橋設置外工事」の遅延に伴い一時中止しています。旧橋から新橋への車両交通の切替えにつきましては、改めて「かわら版」でお知らせします。

工事箇所	工事名	施工箇所	施工時期	工事内容	施工業者	備考
①	元浜橋設置外工事	・尼崎市側 臨港線本線及び北側側道	令和3年11月1日～ 令和4年11月下旬(予定) 令和5年3月末まで	・元浜橋下部工 (A1(完了), A2 橋台) ・上部工 ・臨港線擁壁部構築	(株)松田組 TEL: 0798-67-4056 担当: 山本	【昼間工事】 本線路肩規制 高架下市道 通行止
②	南武橋道路改良工事	・西宮市側 臨港線アプローチ部 (東鳴尾町～南武橋西詰交差点) ・西宮市道部	令和4年5月下旬～ 7月初旬(予定) 工事一時中止 (令和5年4月より再開)	・縁石工、排水構造物工	(株)大永建設 TEL: 070-1305-6292 担当: 長谷	一部施工済み
③		・尼崎市側 臨港線アプローチ部 ・尼崎市道部	令和4年7月初旬～ 7月下旬(予定) 工事一時中止 (令和5年4月より再開)	・縁石工、排水構造物工		未着手


1. 工事期間中の通行規制

①尼崎市道 2414 号線の臨港線高架下:平日昼間(9:00～17:00) 通行止 継続

元浜橋の施工に関連しまして、これまでに引き続き臨港線高架下の平日昼間通り抜けが出来ません。
※平日昼間(9:00～17:00) 以外は開放しますので平日夜間及び休日は通行可能です。


②西宮市側 臨港線アプローチ部、西宮市道部:工事一時中止 中断

③尼崎市側 臨港線アプローチ部、尼崎市道部:工事一時中止 中断

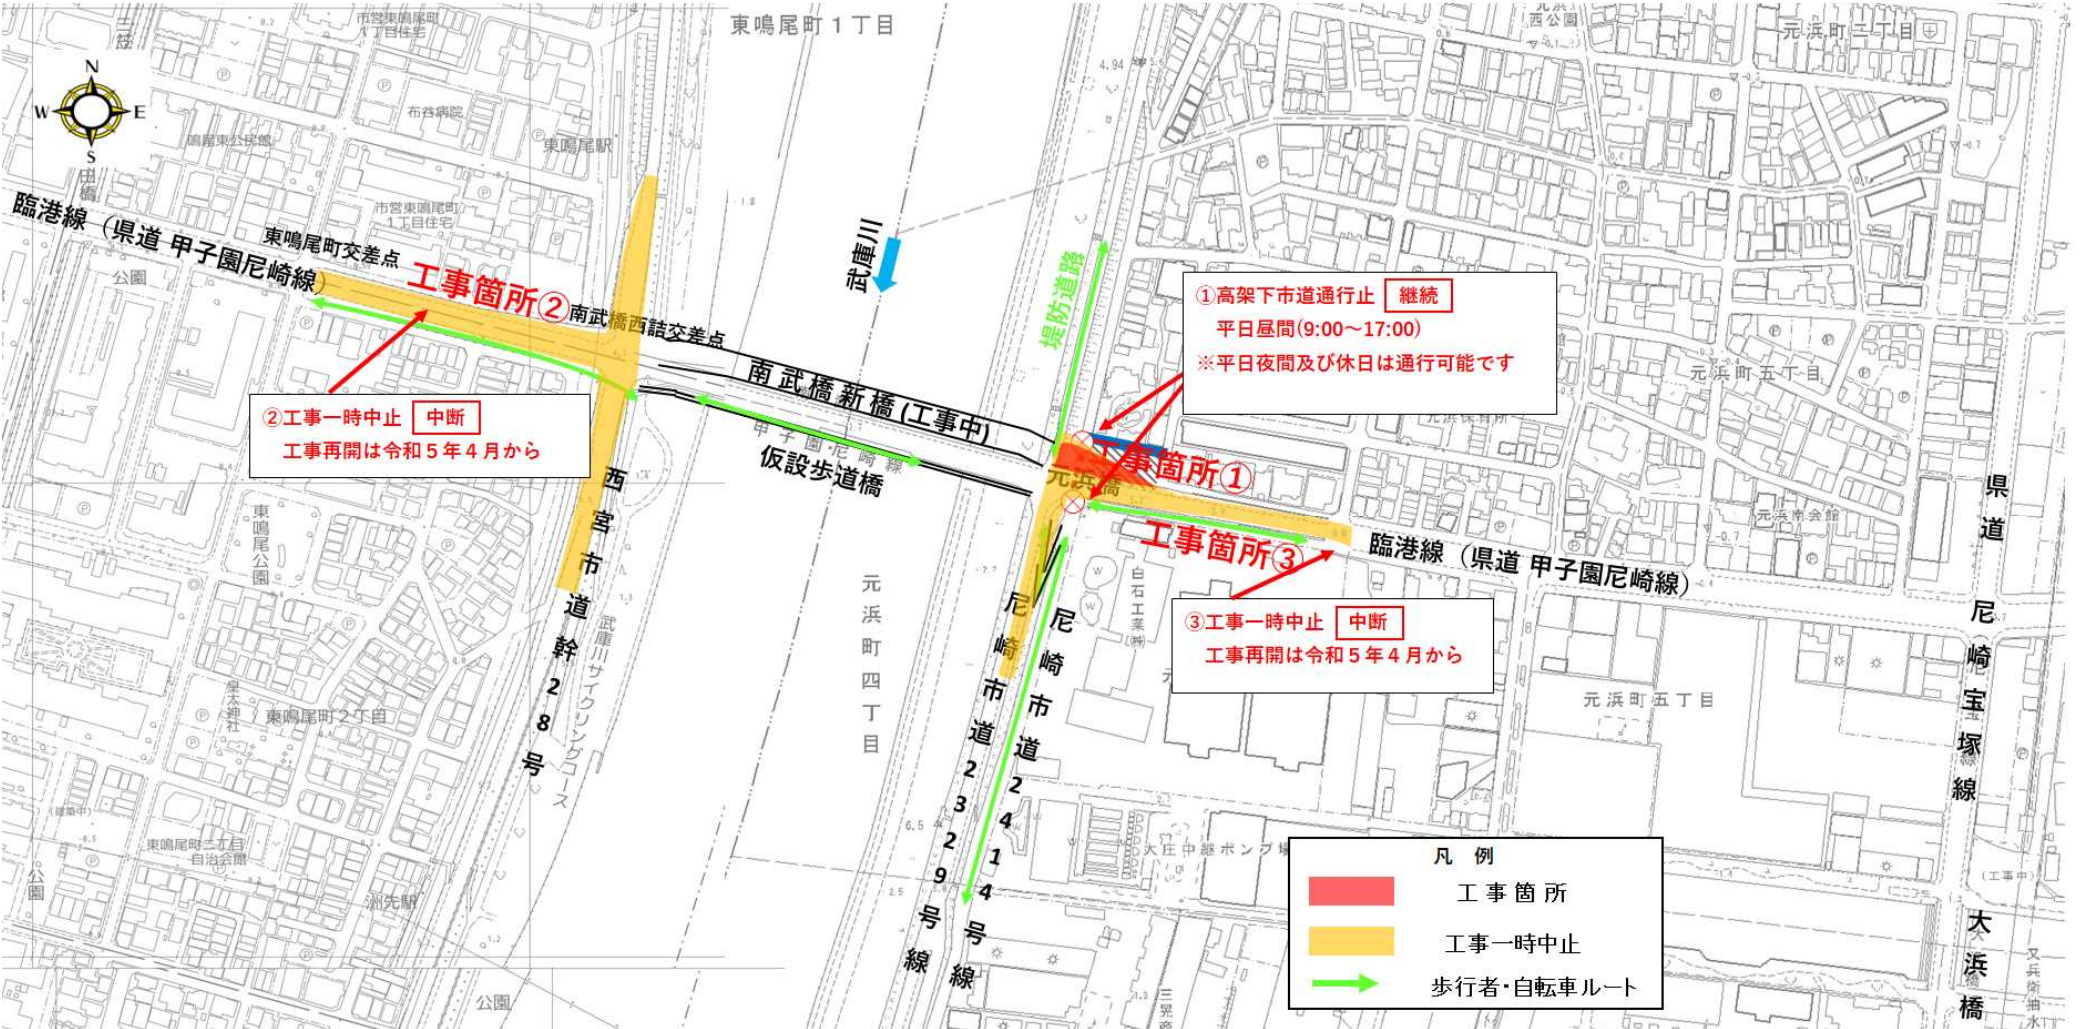

3. 現在の現場写真

発生した地中埋設物①

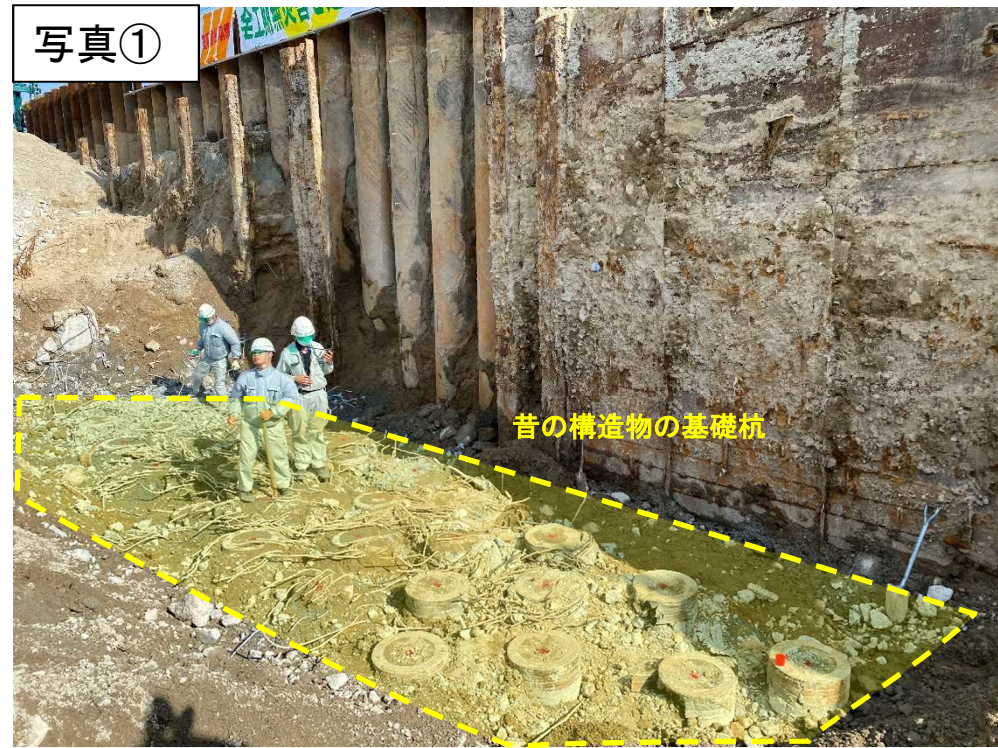

発生した地中埋設物②



4. 工事全体のスケジュール

工事の遅延により、南武橋新橋への車両交通の切替えは令和5年の夏頃を予定しています。

項 目	R3年度			R4年度			R5年度			R6年度		
	出水期	11月	非出水期	6月	出水期	11月	非出水期	6月	出水期	11月	非出水期	6月
右岸(西宮市側)												
南 武 橋												
左岸(尼崎市側)												
南武橋 架け替え事業関連 西電力設備移設工事												

南武橋にかかる工事の問合せ：
兵庫県 阪神南県民センター 西宮土木事務所
武庫川対策室 武庫川事業課 TEL：0798-39-6145
担当：足立
